CALENDARIO
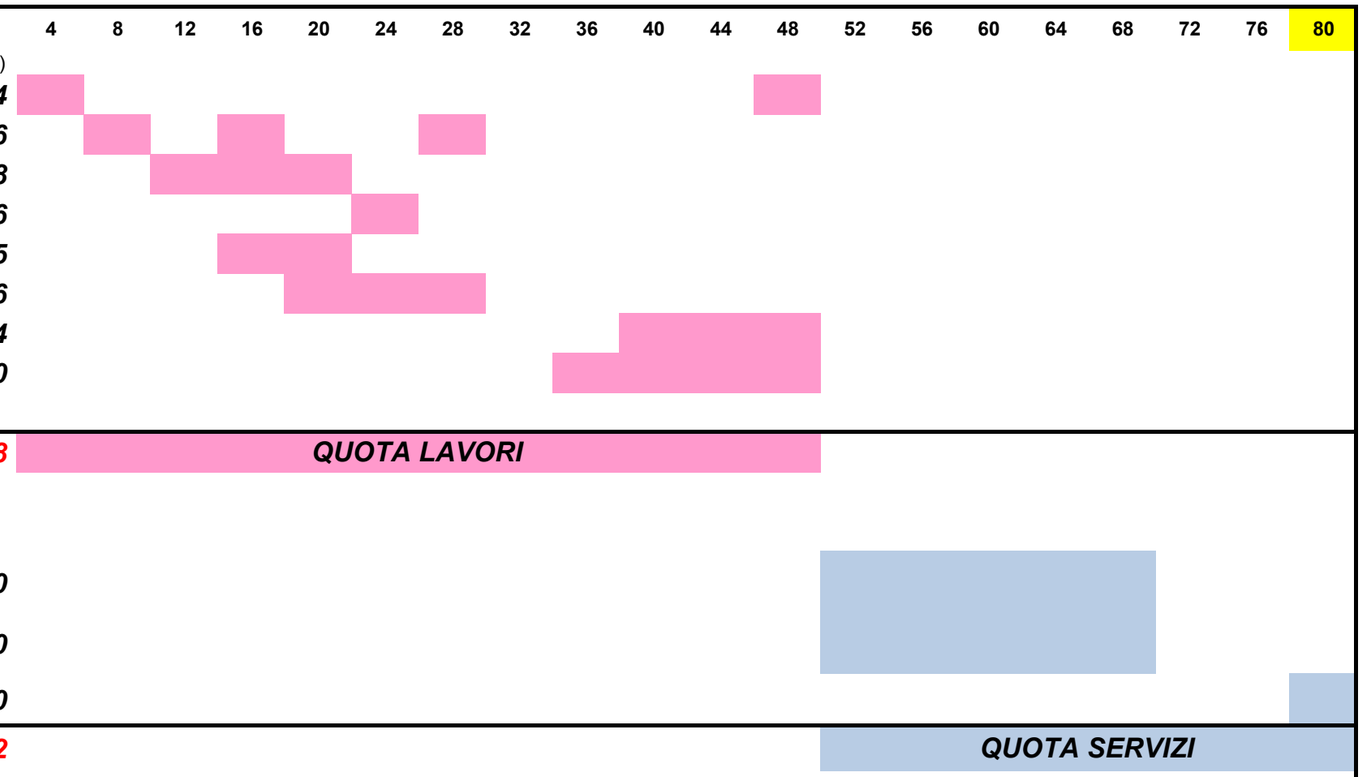
	attività	durata (gg)
QUOTA LAVORI	Allestimento/Rimozione cantiere	4
	apprestamento area di cantiere e segnaletica temporanea	6
	scavi demlizioni rimozioni	8
	pozzetti	6
	realizzazione spire	5
	realizzazione cavidotti	6
	realizzazione basamenti armadi	4
	pavimentazione bituminosa	10
	smobilizzo apprestamenti sicurezza	
	parziale	48
QUOTA SERVIZI	VERIFICA E COLLAUDO RETI TECNOLOGICHE REALIZZATE	
	ALLACCI ALLE UTENZE ESISTENTI	
	Installazione delle apparecchiature (vedi art. 1 capitolato appalto - sezione tecnico prestazionale servizi)	20
	Attività di formazione per l'utilizzo del software di gestione (vedi art. 1 capitolato appalto - sezione tecnico prestazionale servizi)	20
	Inizio effettivo del servizio	30
	parziale	32
	totale (gg)	80
